



關埔國小工程規劃與進度報告_{111.2.24}

總務主任林柏妤

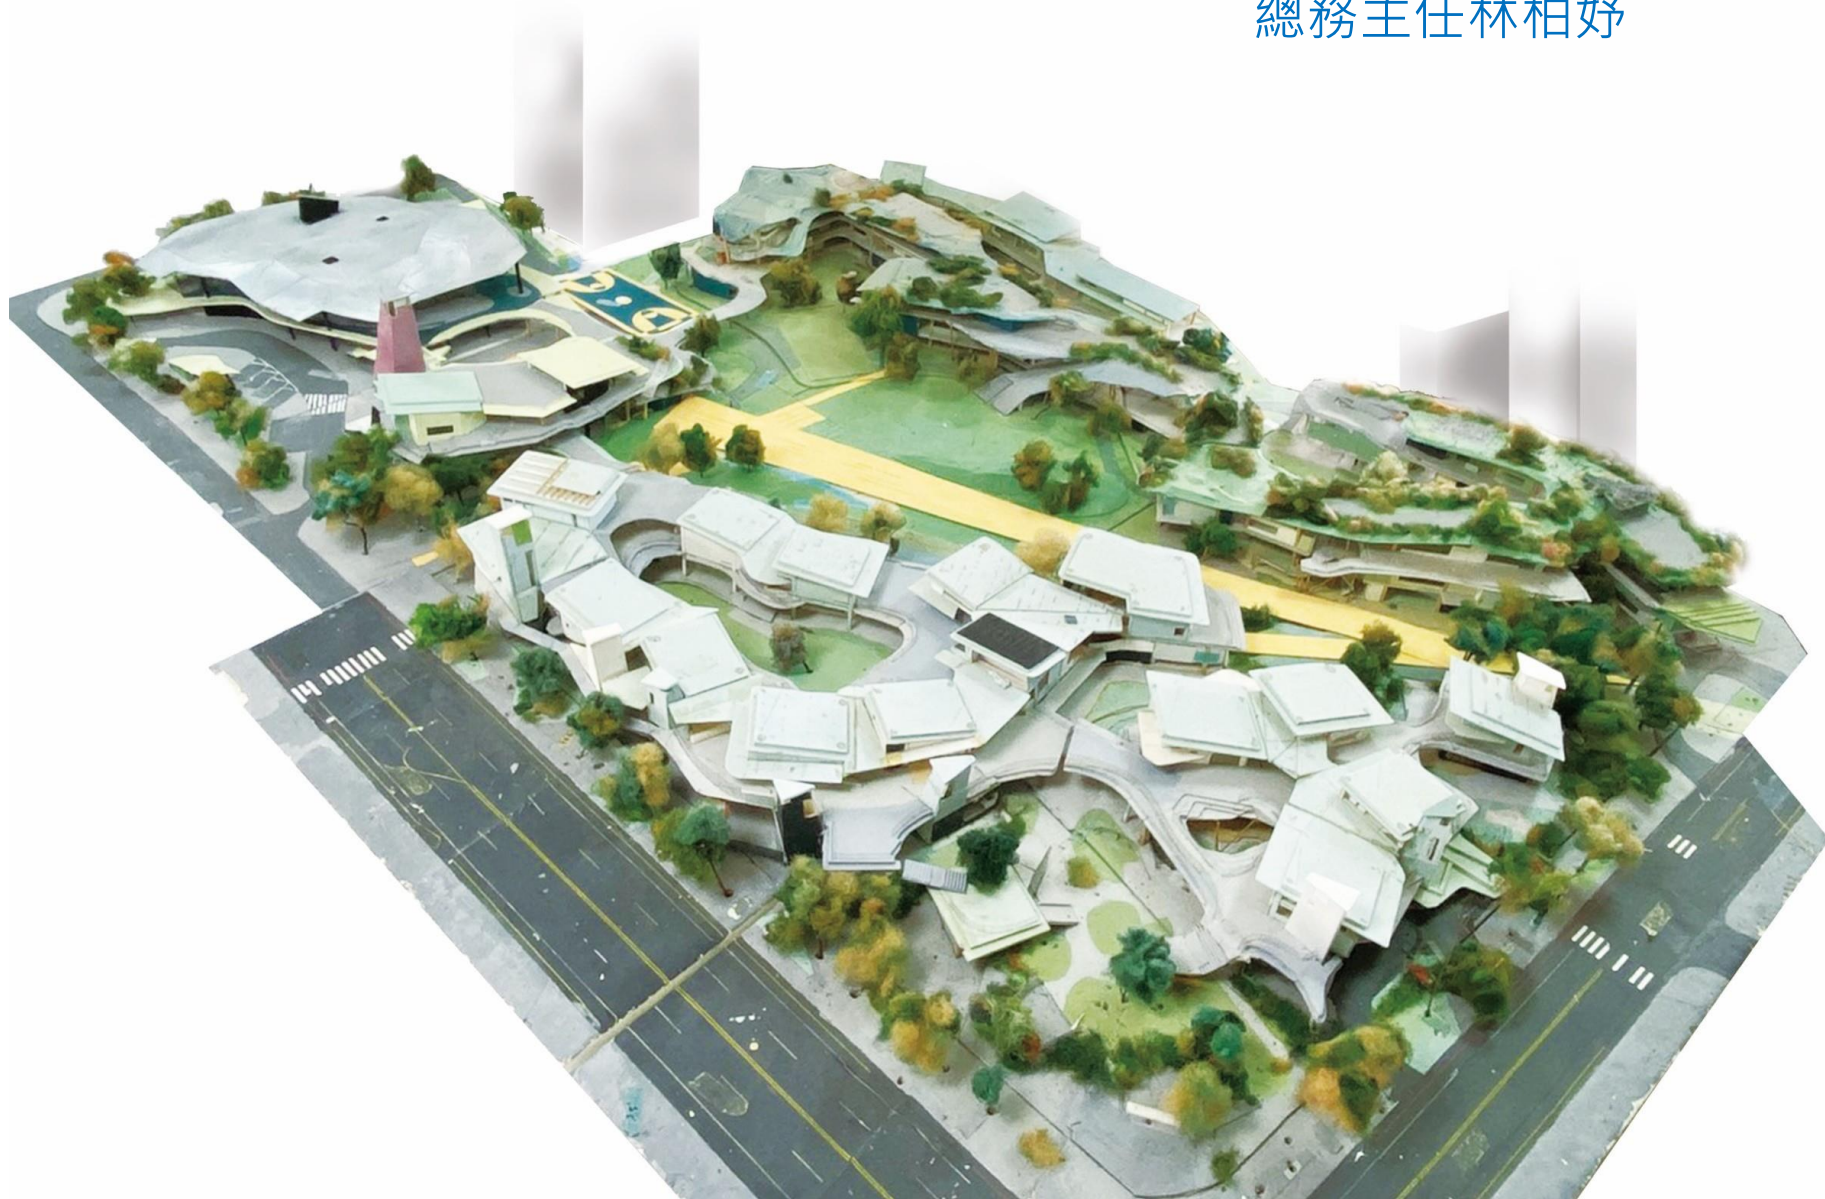

111學年度校區範圍

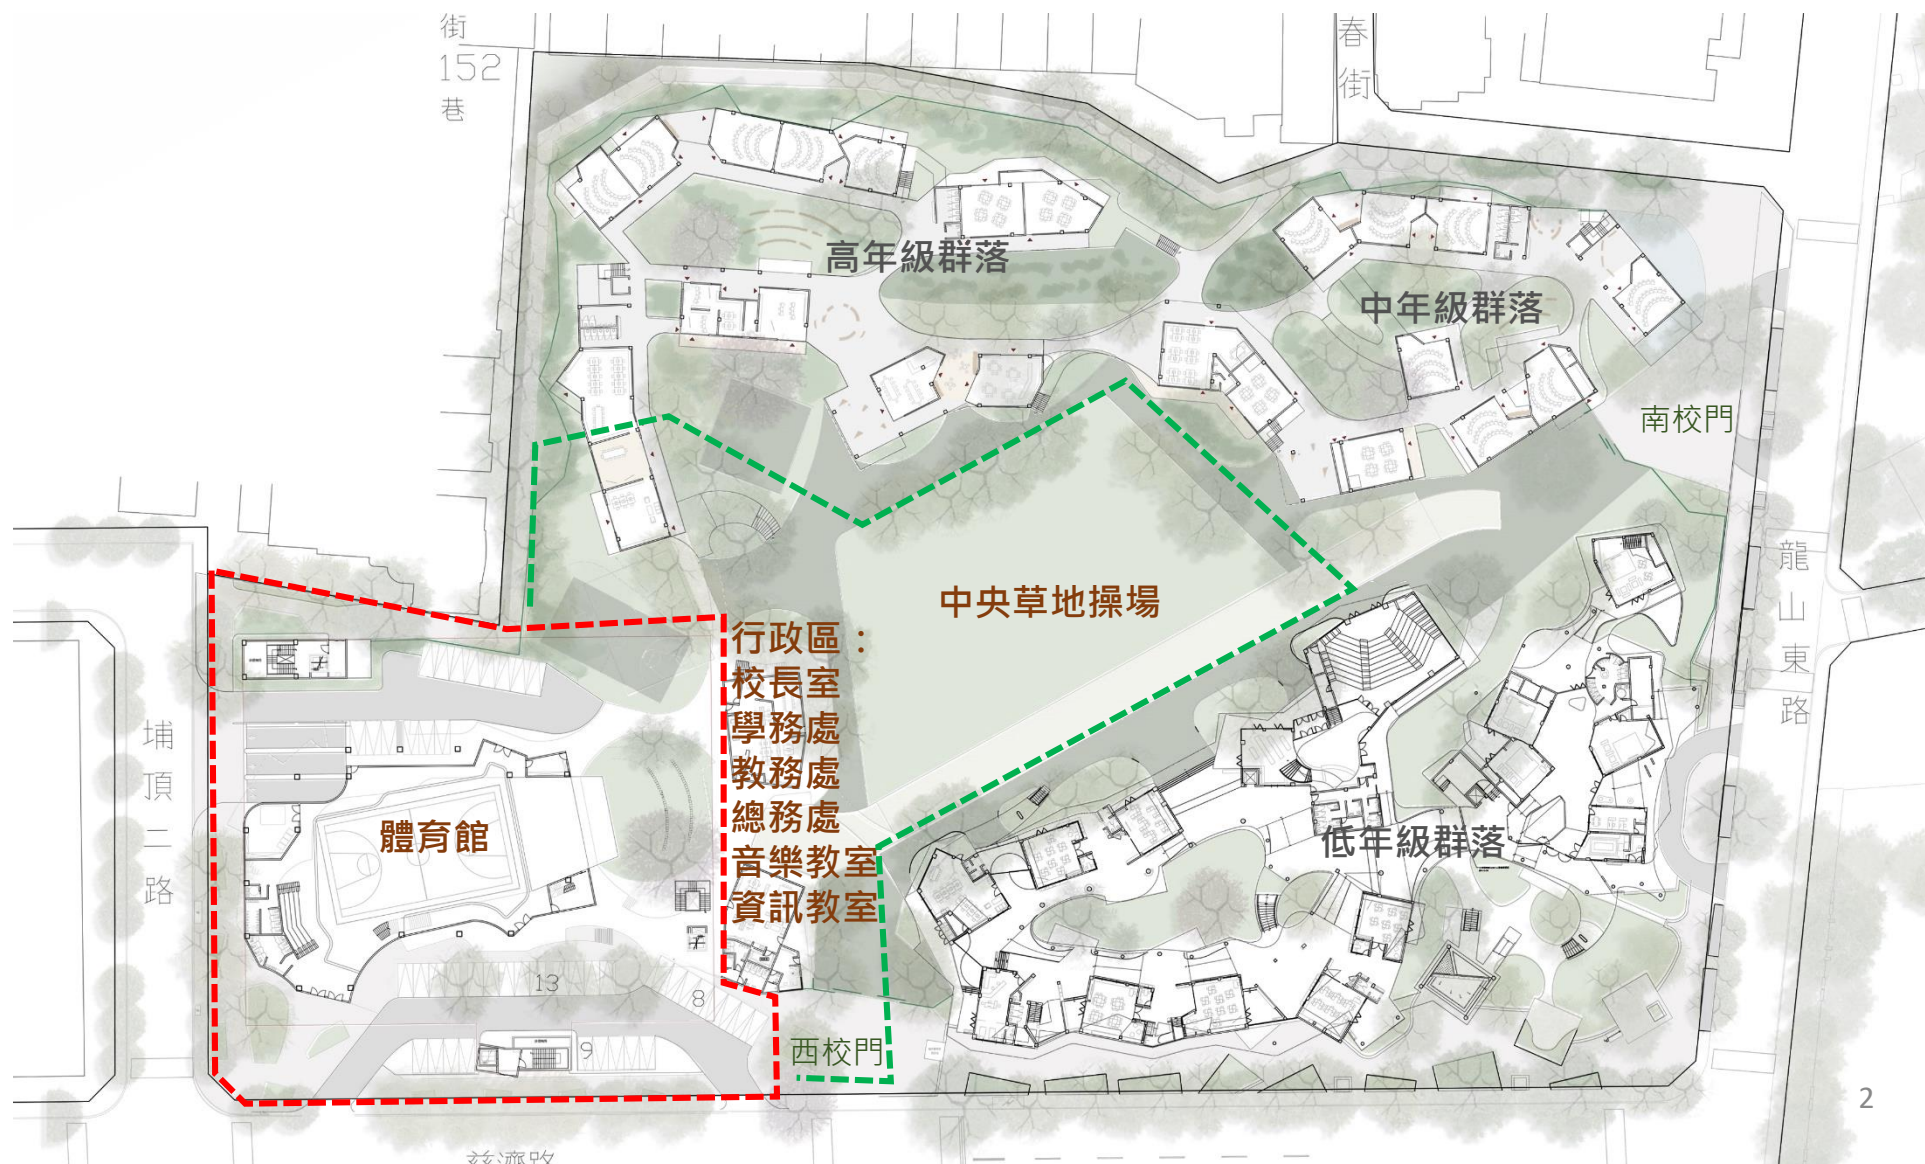

高年級新校舍111.8啟用


高年級EF區：22間普通教室
5間專科教室-自然*3、音樂*1、資訊*1
2間特教教室
輔導處、科任辦公室



不同年段的教室設計，符應個別身心階段發展

低年級群落


4

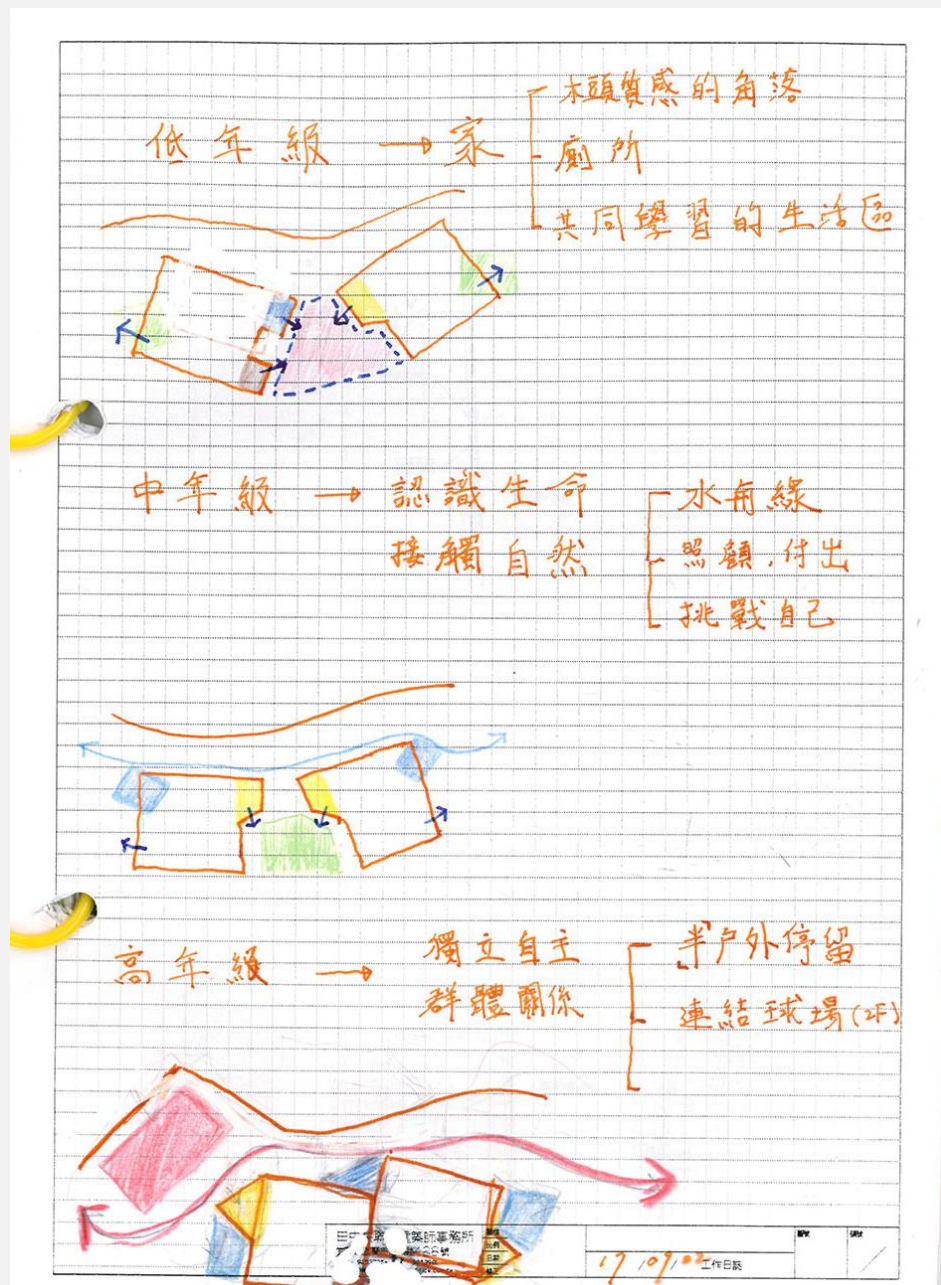

中年級群落



高年級教室 111.2裝修工程現況

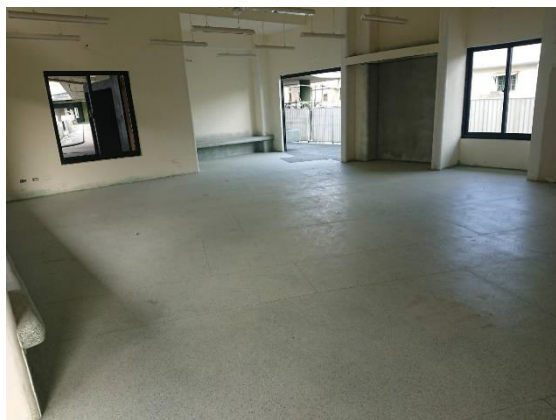

彈性多元教學空間(已完工，使用實況)



專科研討教室



視聽表藝教室



中年級群落-美術手作教室




低年級群落-肢體律動教室



主題閱讀教室


新校舍設備採購以最有利標評選優良廠商

110年度採購案清單			
編號	案號	標案名稱	預算金額
1	11002001	109學年度第二學期簿本及課程材料財物採購案	462,379
2	11002002	110學年度學校午餐外訂盒餐財物採購	12,708,800
3	11002003	110年度新設兒童遊戲場設施設備財物採購	3,989,910
4	11002004	110年度訂製黑板木作櫃財物採購案	420,000
5	11002005	110年度幼兒園教保教具設備採購案	700,000
6	11002006	110學年度班級多點互動式觸控電視設備	816,000
7	11002007	110年度STEAM教具設備採購案	288,870
8	11002008	「109學年度新校舍可調式課桌椅及黑板設備」後續擴充	1,057,000
9	11002009	「109學年度移動智慧教室平板與充電車設備採購」後續擴充	136,500
10	11002010	110學年度第1學期簿本及課程材料財物採購案	507,205
11	11002011	110學年度移動智慧教室設備採購案	365,093
12	11003001	109學年度兒童課後照顧服務勞務採購	1,191,000
13	11003002	110年度校內清潔維護及行政庶務外包勞務採購	316,945
14	11003003	C區新校舍冷氣機改善勞務採購	174,130
15	O20210331000006	一對一分離式冷氣8.0kW(含)壁掛式能源效率1級3台	138,709
16	O20210519000043	15吋筆記型電腦第10代Intel Core i5 8台	195,952
17	O20210519000042	一般型電腦Intel Core i7及23.5吋液晶顯示器8組	240,000
18	O20210615000005	幼兒園一般型電腦及顯示器8組、數位相機4台	249,776
19	O20210616000031	幼兒園教室投影機及無線投影伺服器4組	144,000
20	O20210625000042	110年7-12月警衛勤務保全人力	732,947
21	O20210830000024	110年7-12月警衛勤務保全人力加購	105,915
22	O20210914000003	移動智慧教室13吋筆記型電腦72台	1,748,232
23	O20210723000041	手作教室電腦投影機1組	67,850
		合計	26,689,363

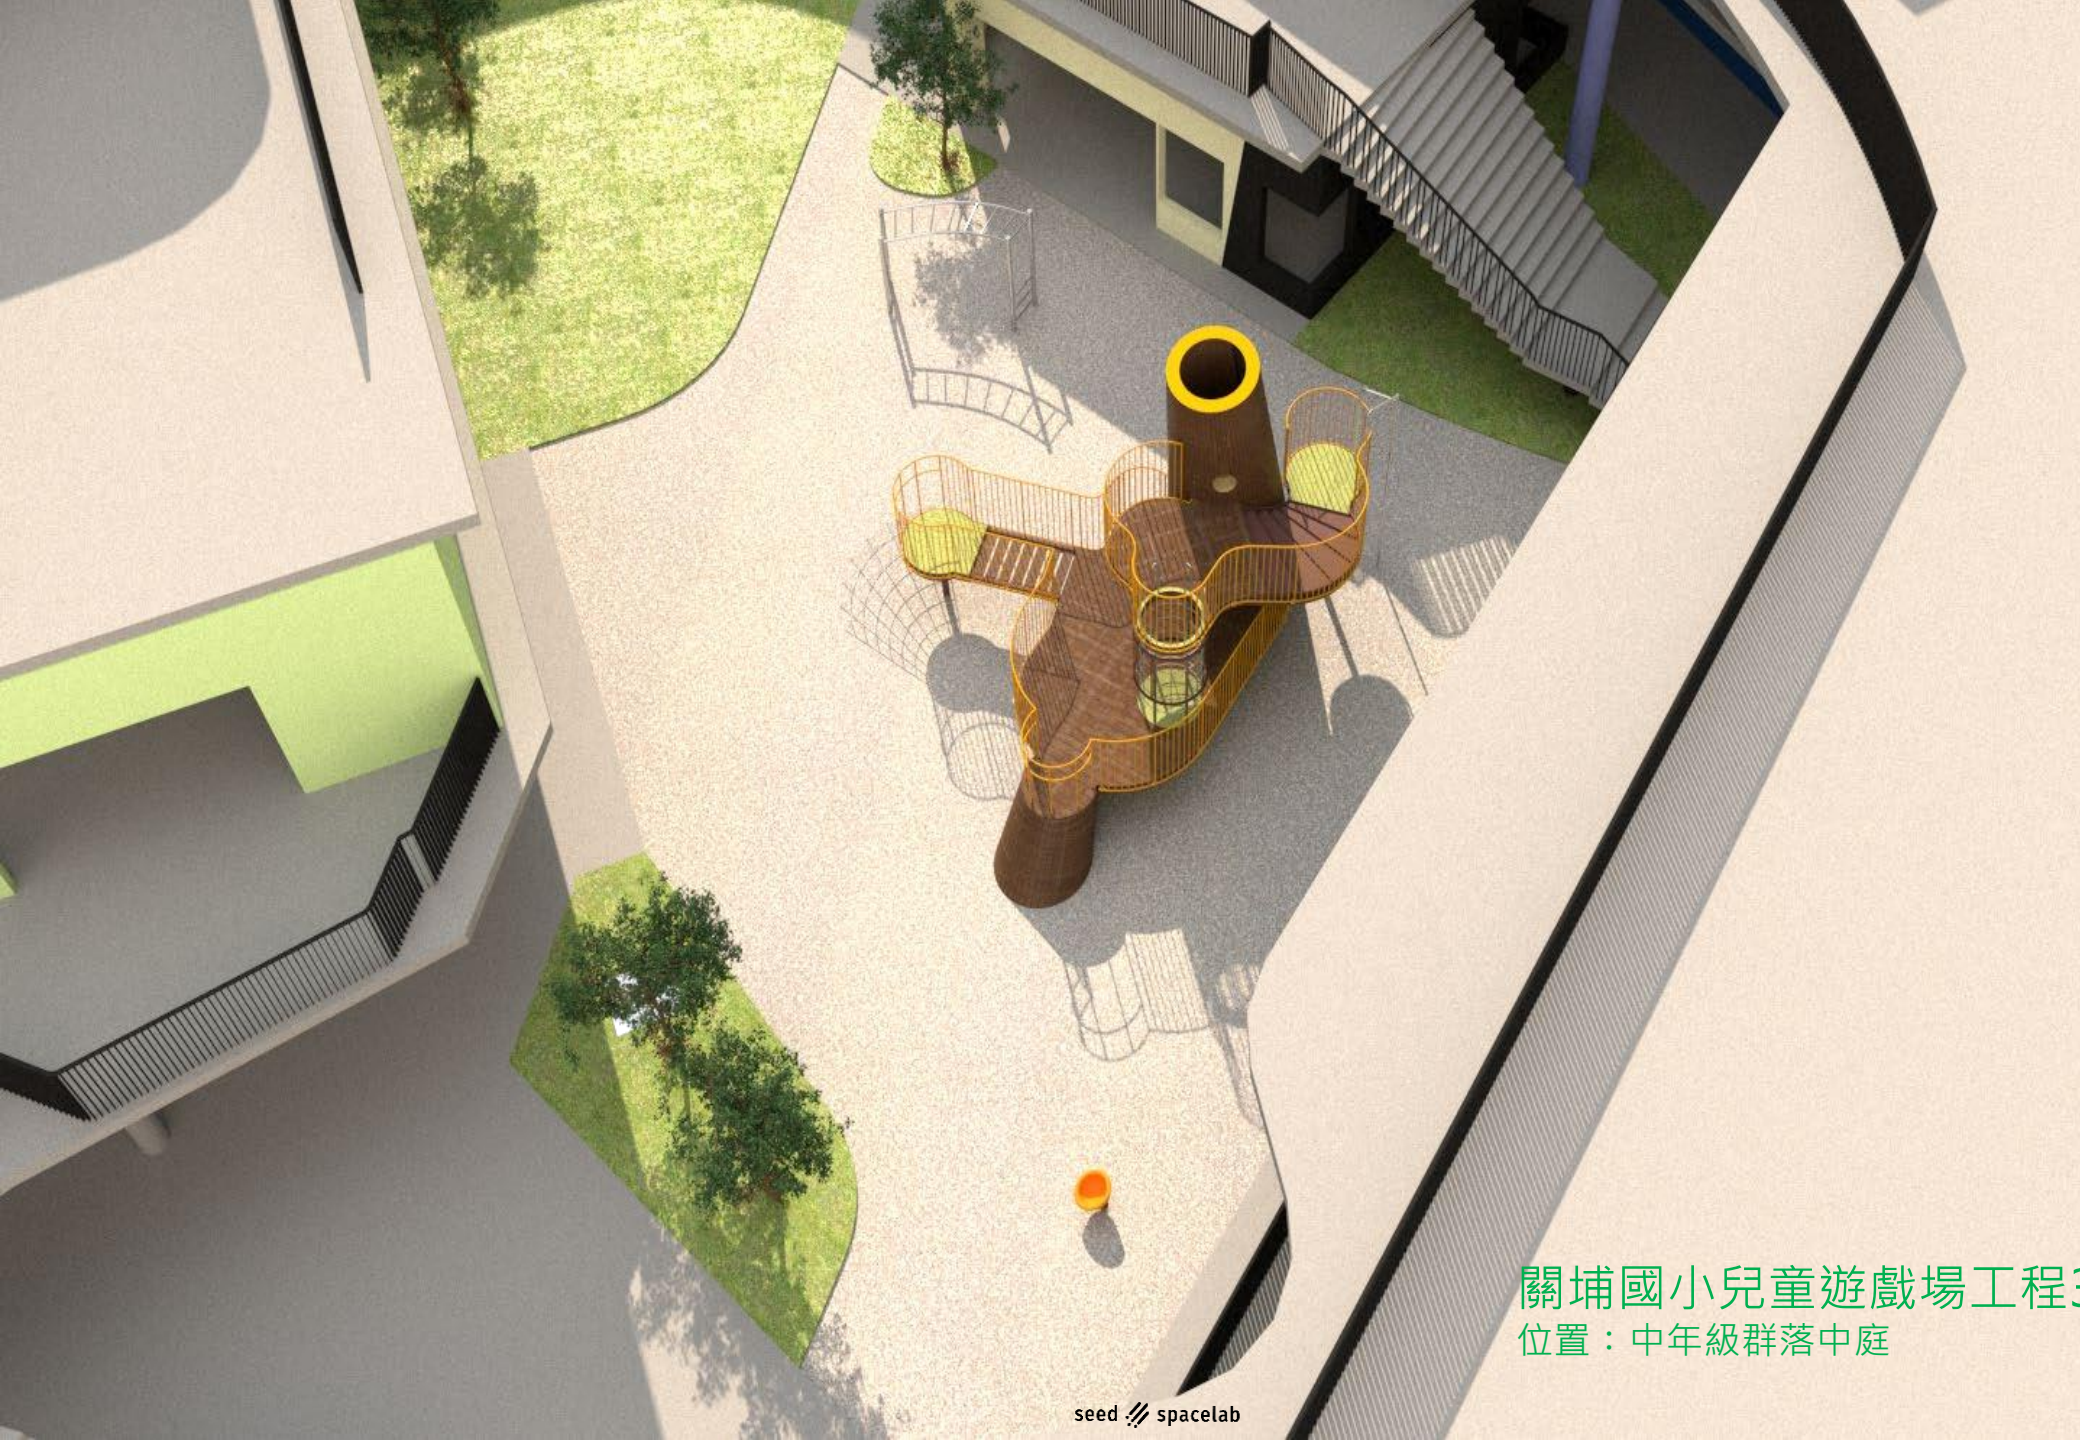

關埔國小兒童遊戲場工程3
位置：中年級群落中庭


兒童遊戲場工程

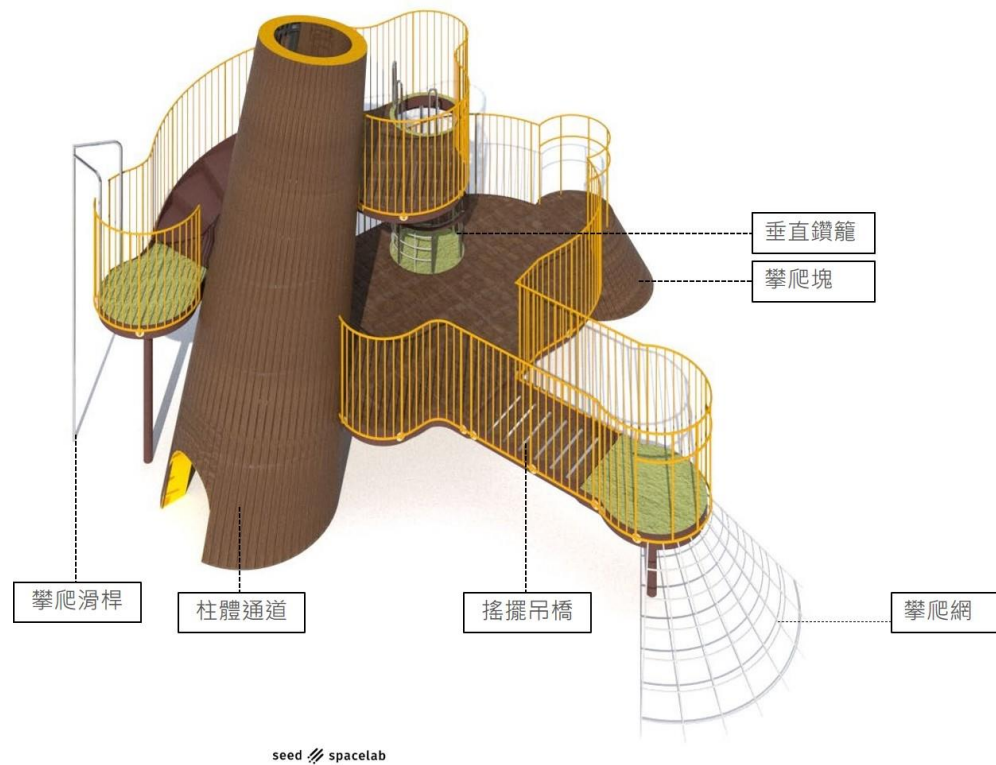




設計單位/ 彡 苗空間設計工作室
開工日期/110.12.16
預計完工日期/111.3.31



校舍工程預計期程

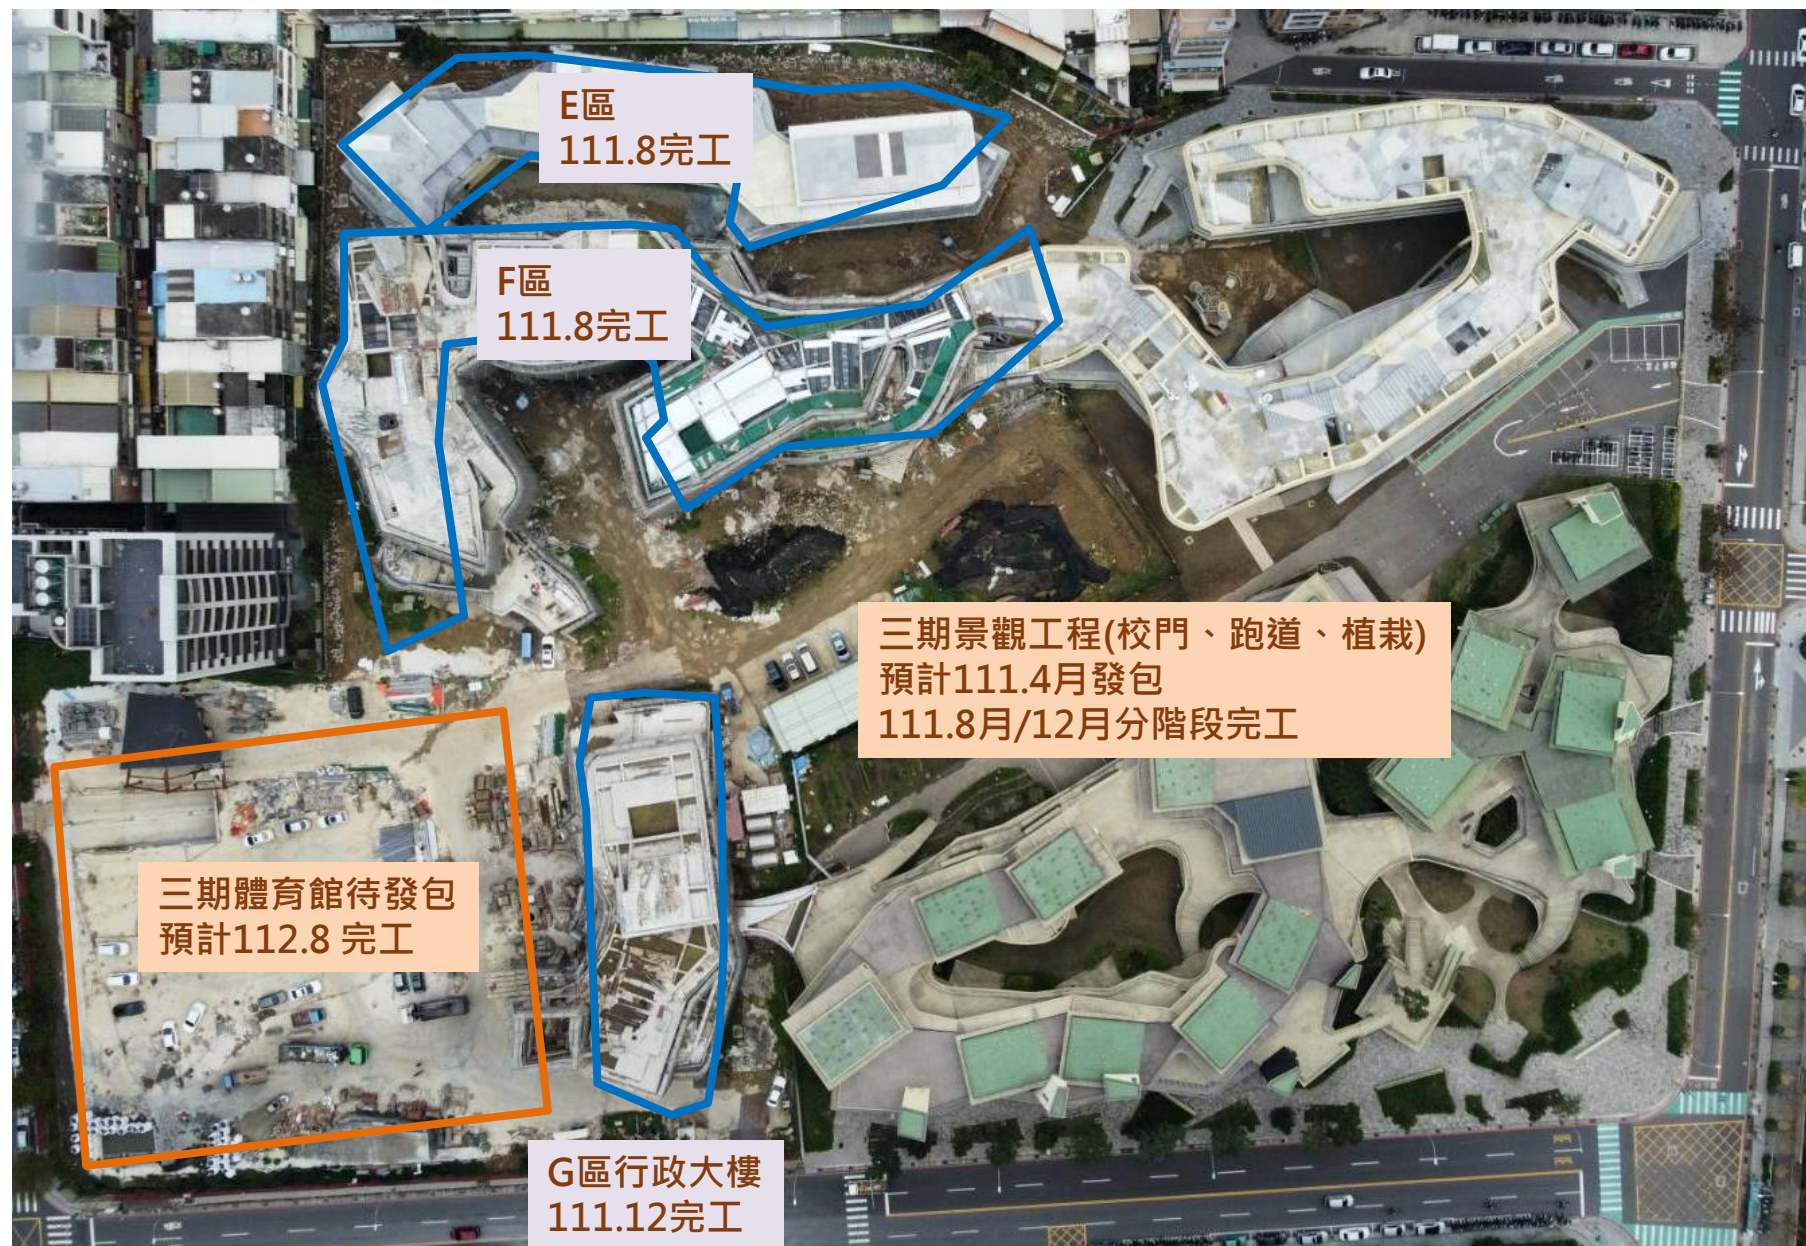


體育館工程-籃球場、羽球場、排球場、舞台區、二樓看台區

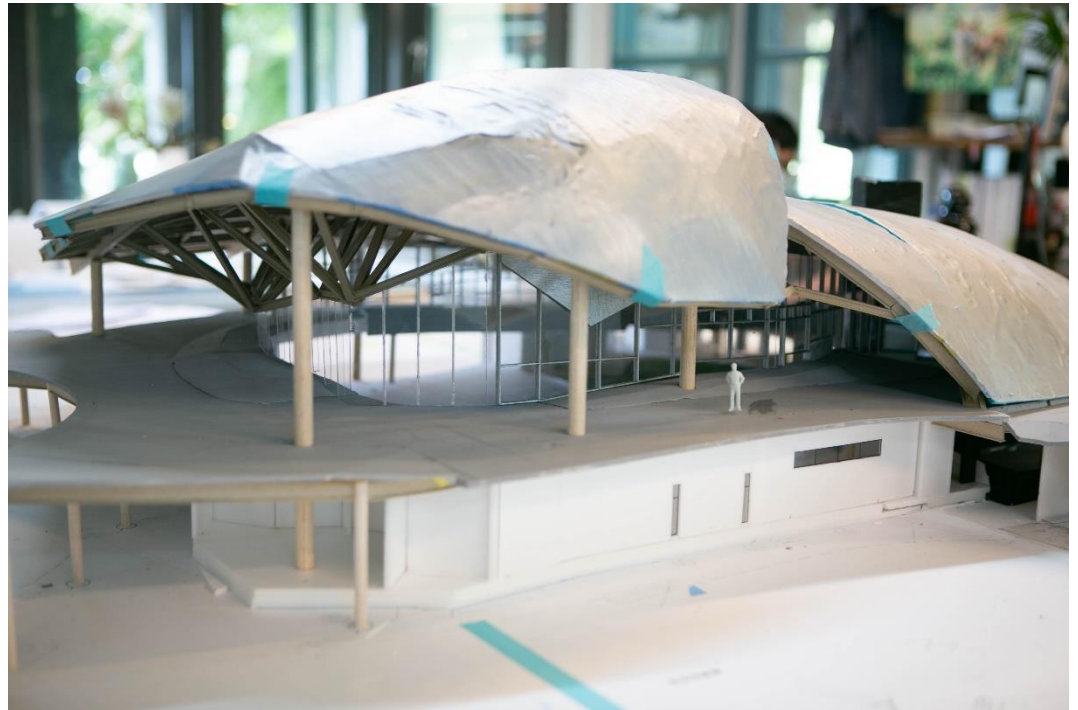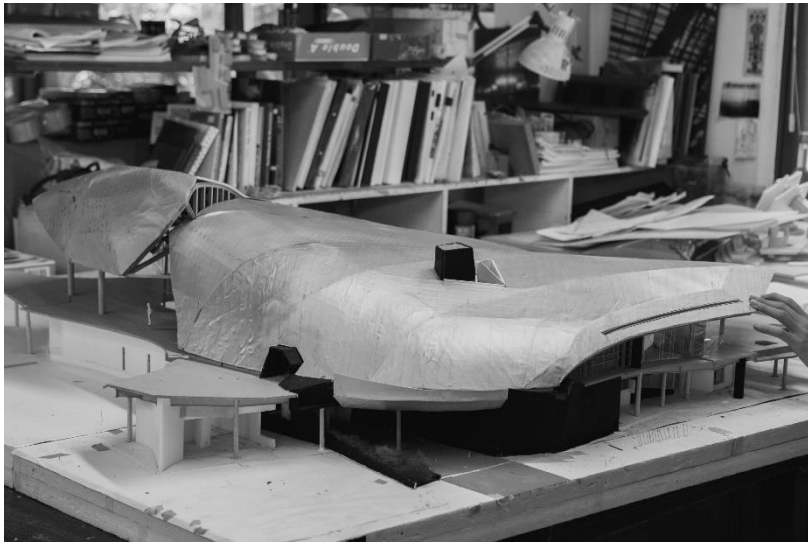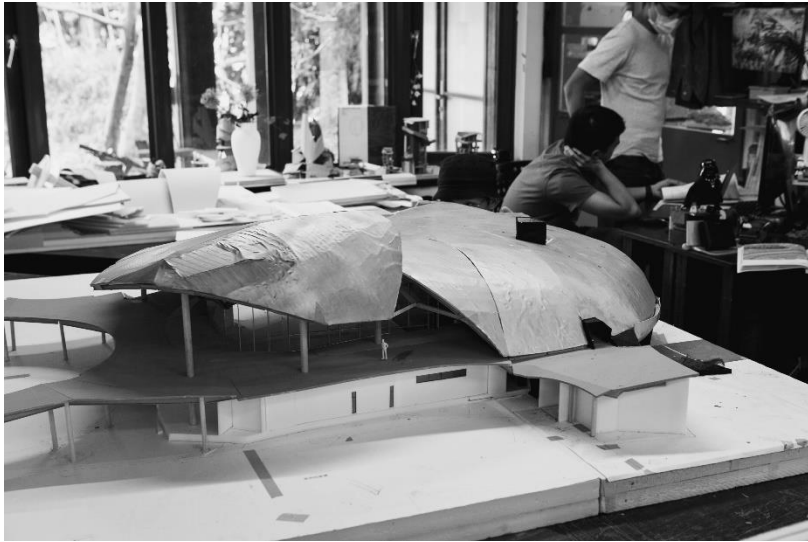

公共藝術案-110.12完成基礎設計圖說



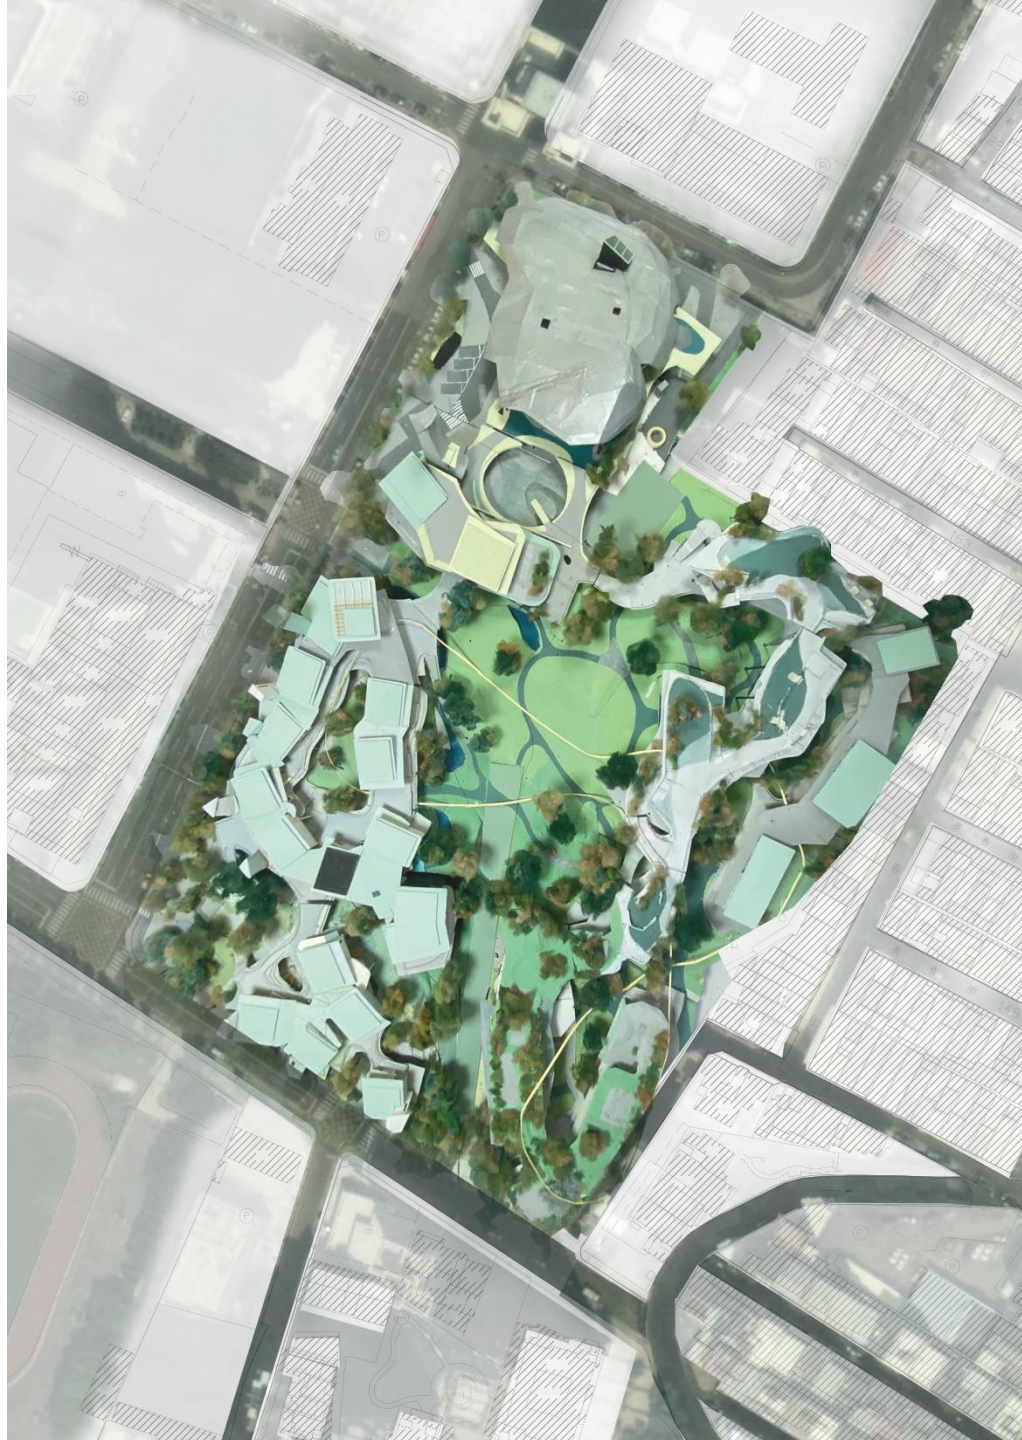

關埔未來式-

期待用更高的眼光，
構築未來無限可能，
探索「未完成」的教育藍圖，
我們已經走在「完成」的道路上。
感謝家長和我們相伴同行 ❤️
